

Maîtrise d'Oeuvre



Maîtrise d'Ouvrage



Travaux de voirie

Maîtrise d'Ouvrage



Travaux de réseaux




ORBEC - HYPER CENTRE

REVITALISATION DU CENTRE-BOURG HISTORIQUE ET COMMERÇANT


RÉUNION PUBLIQUE DU 19 SEPTEMBRE 2020

ARC-EN-TERRE | 9 rue de Seine, 76113 Sahurs | 02.35.32.82.27 | www.arc-en-terre.fr


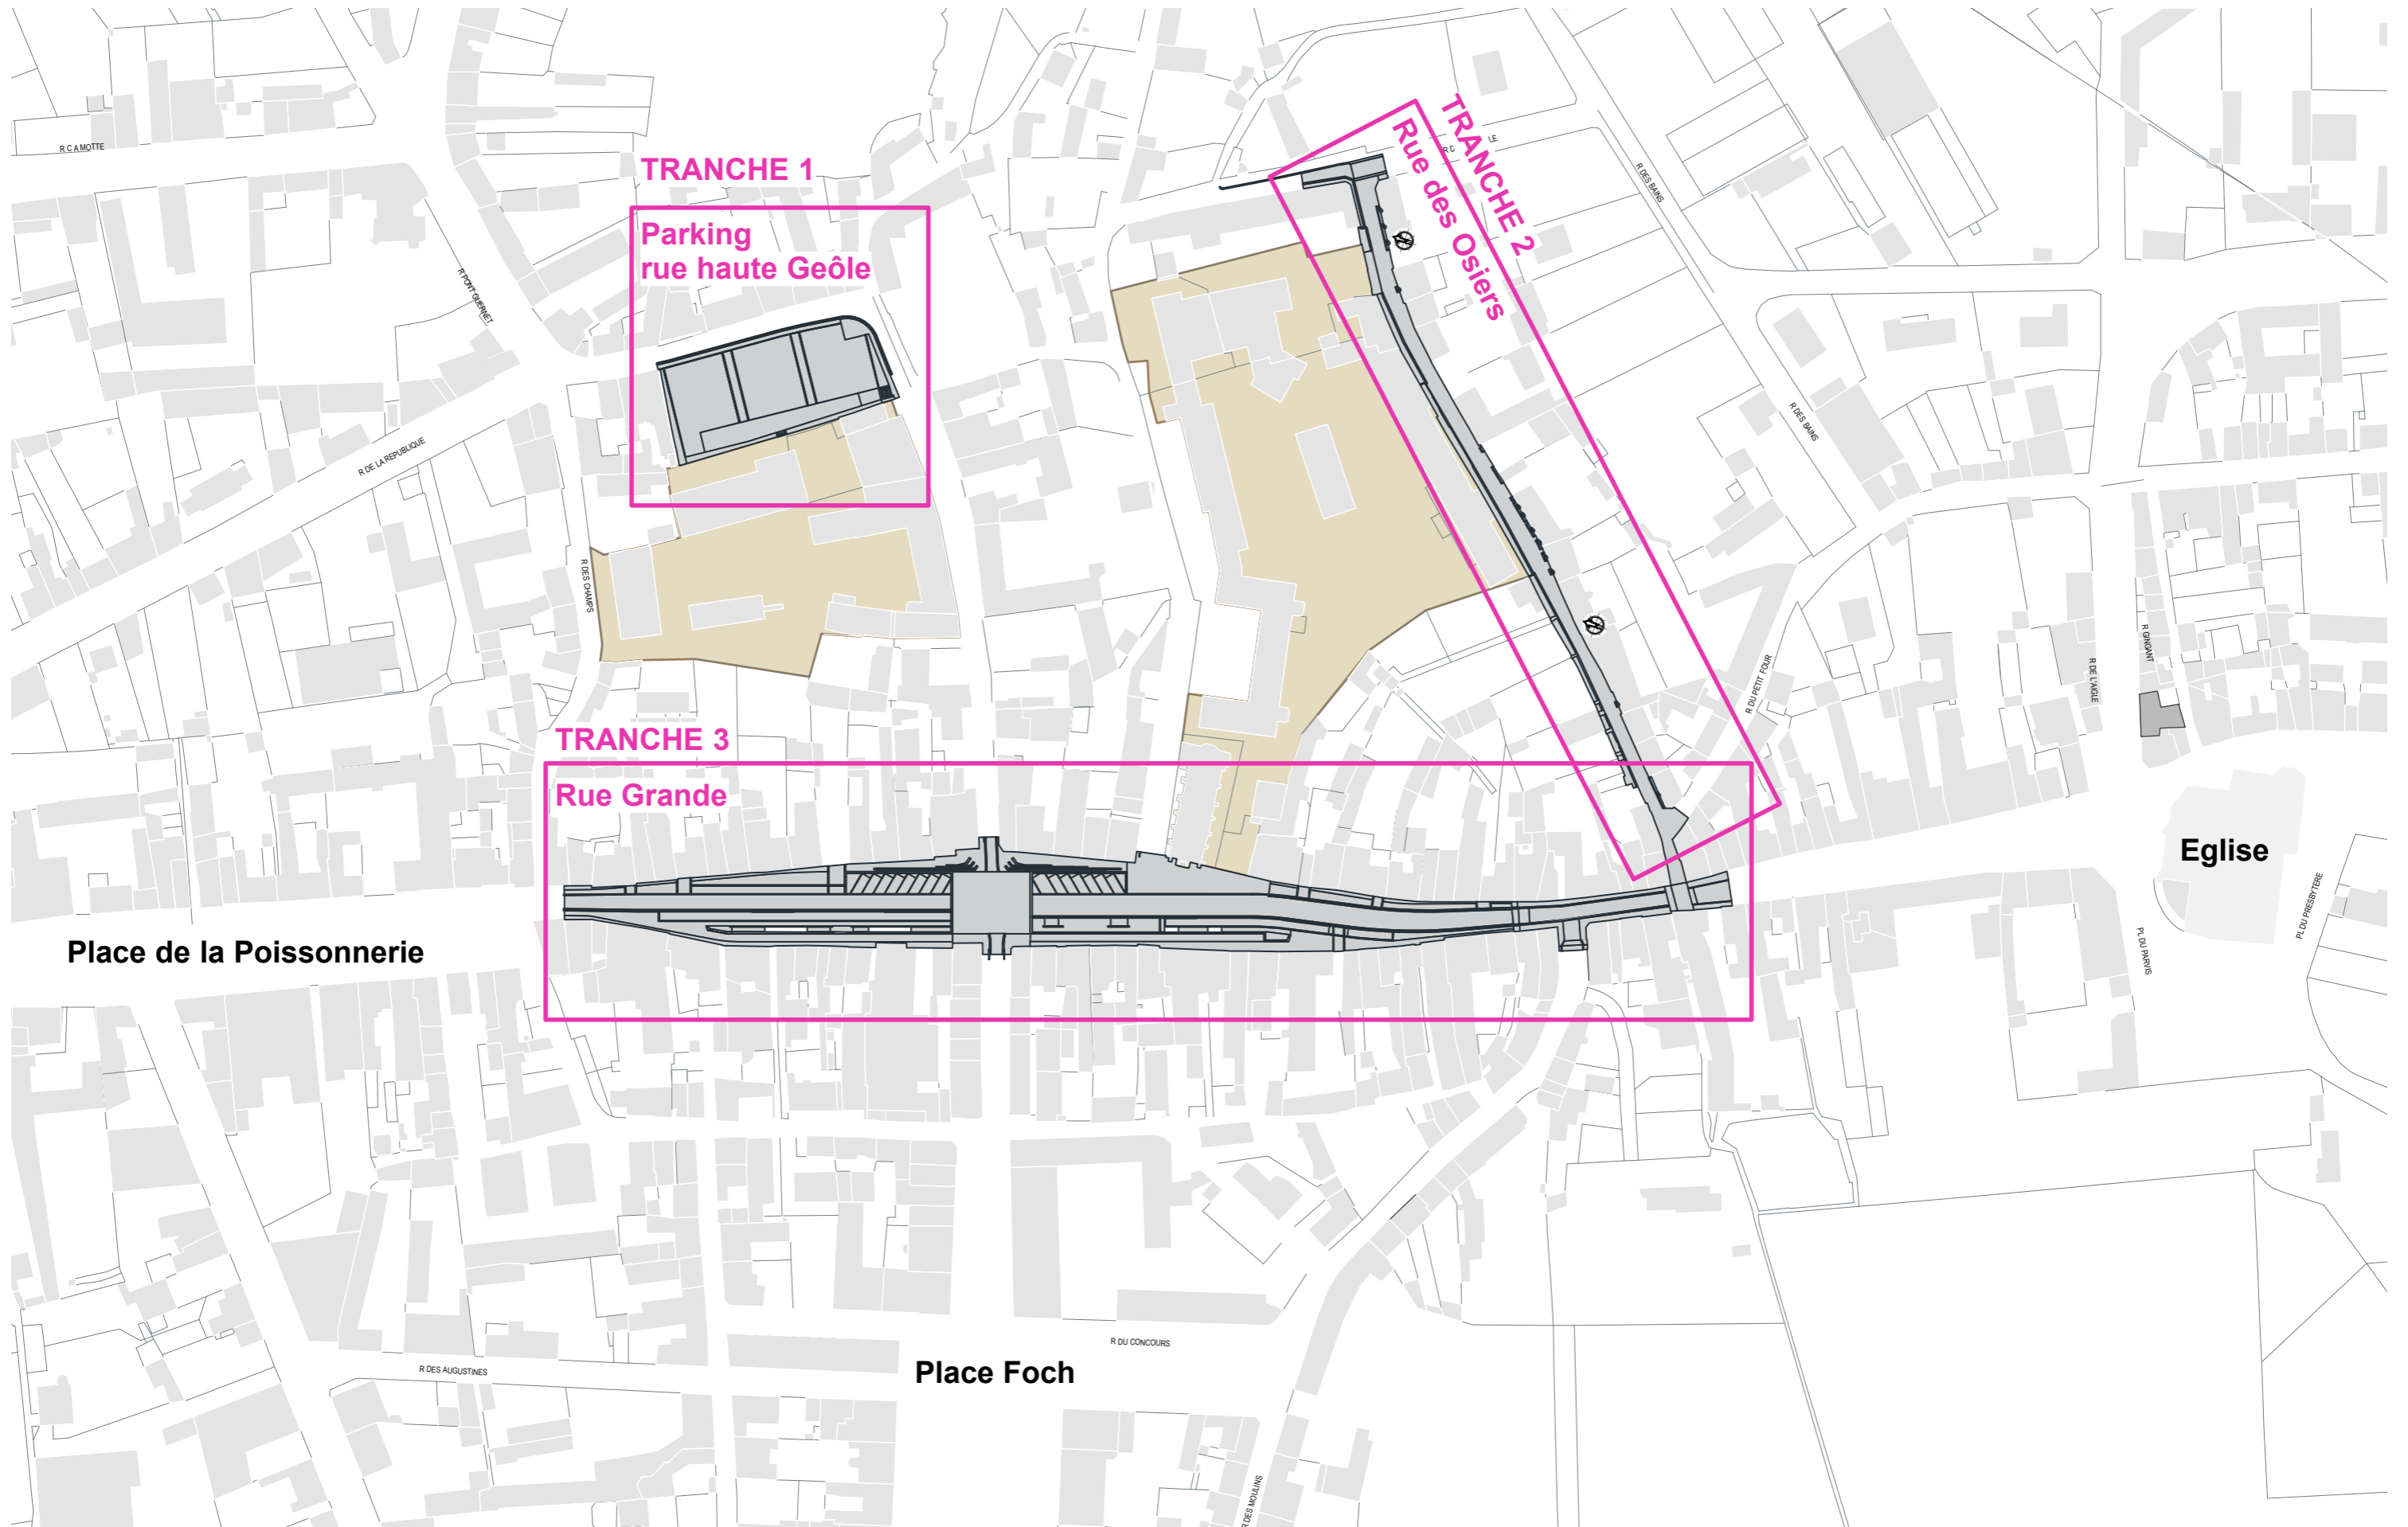


Typologie	Caractéristiques principales
Voiries	sens unique resserré à 4M puis 5,5M
Stationnements	En épis dans la zone de centralité En latéral dans les zones de transition côté impairs
Nombres	33 stationnements zone bleue 1 place PMR 6 places stationnement minute
Aires de livraison	2 zones réglementées - mutualisation avec stationnements minutes - plage horaire
Convoyeurs de fond	Accès normalisés pour la SG et la CIC

Coupe AA'

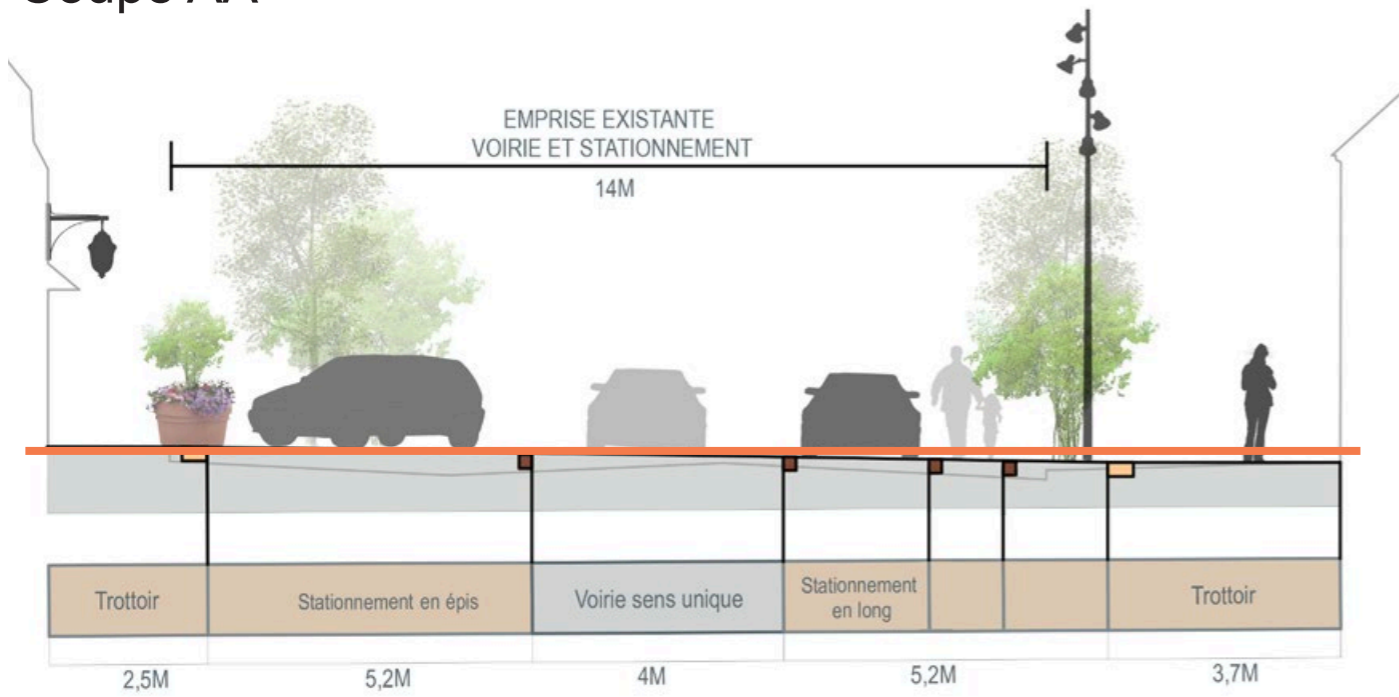

Coupe BB'

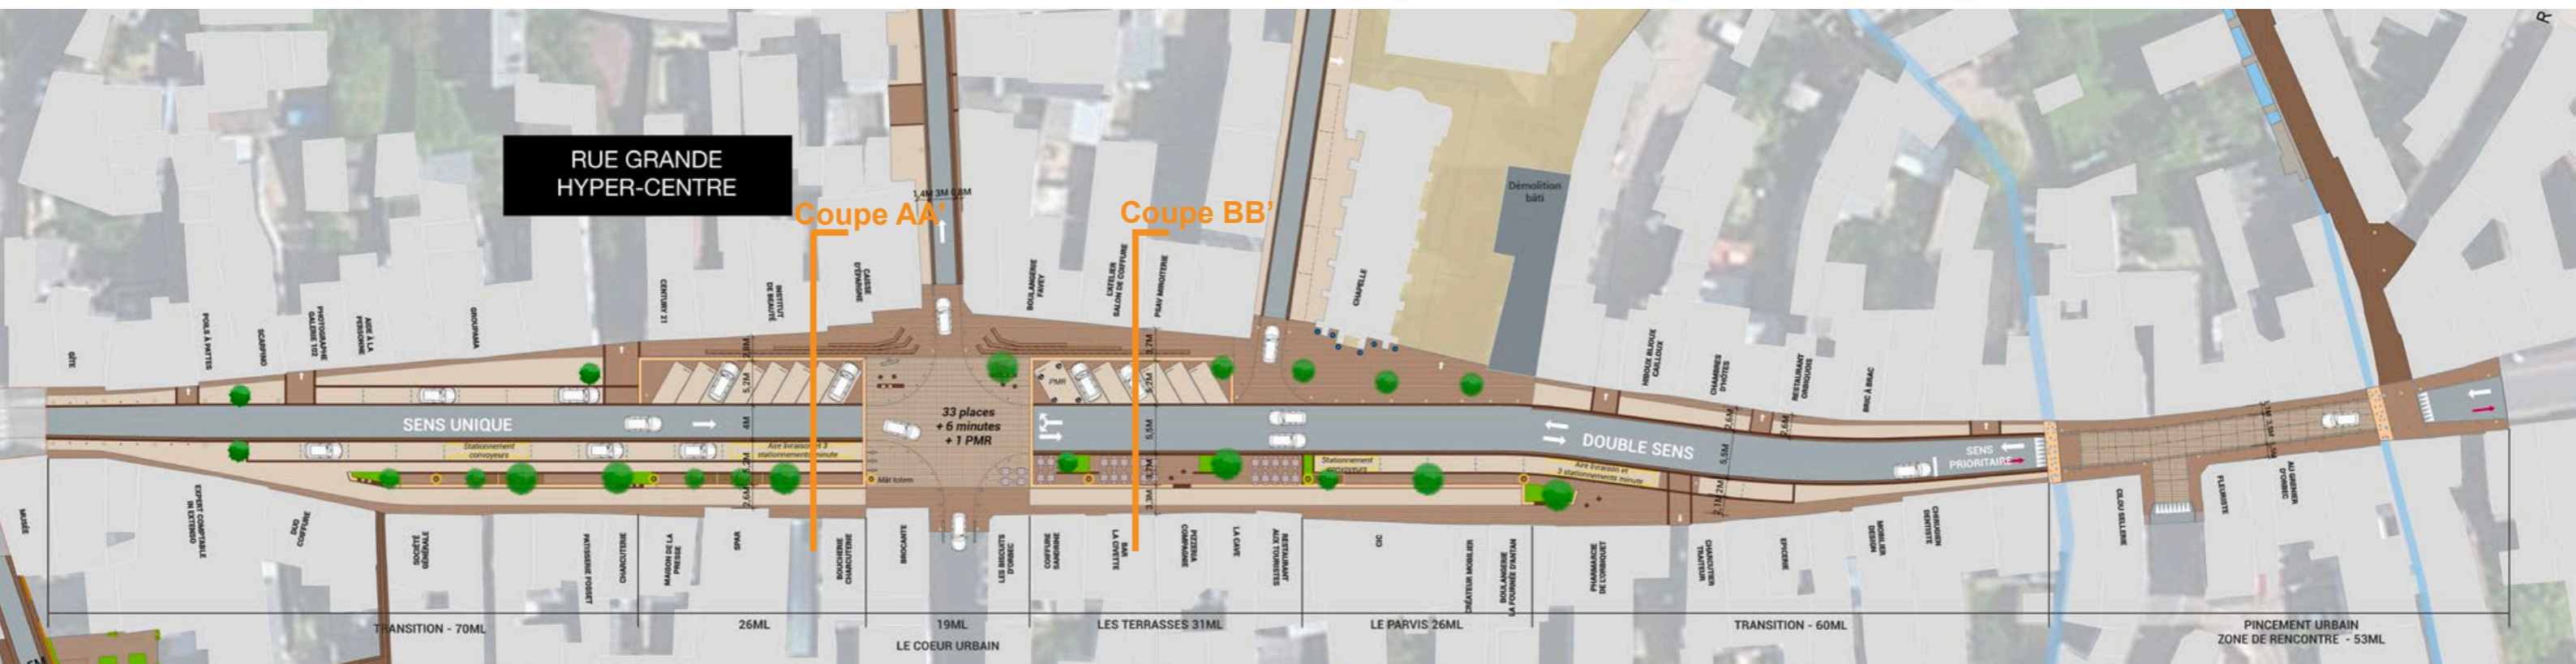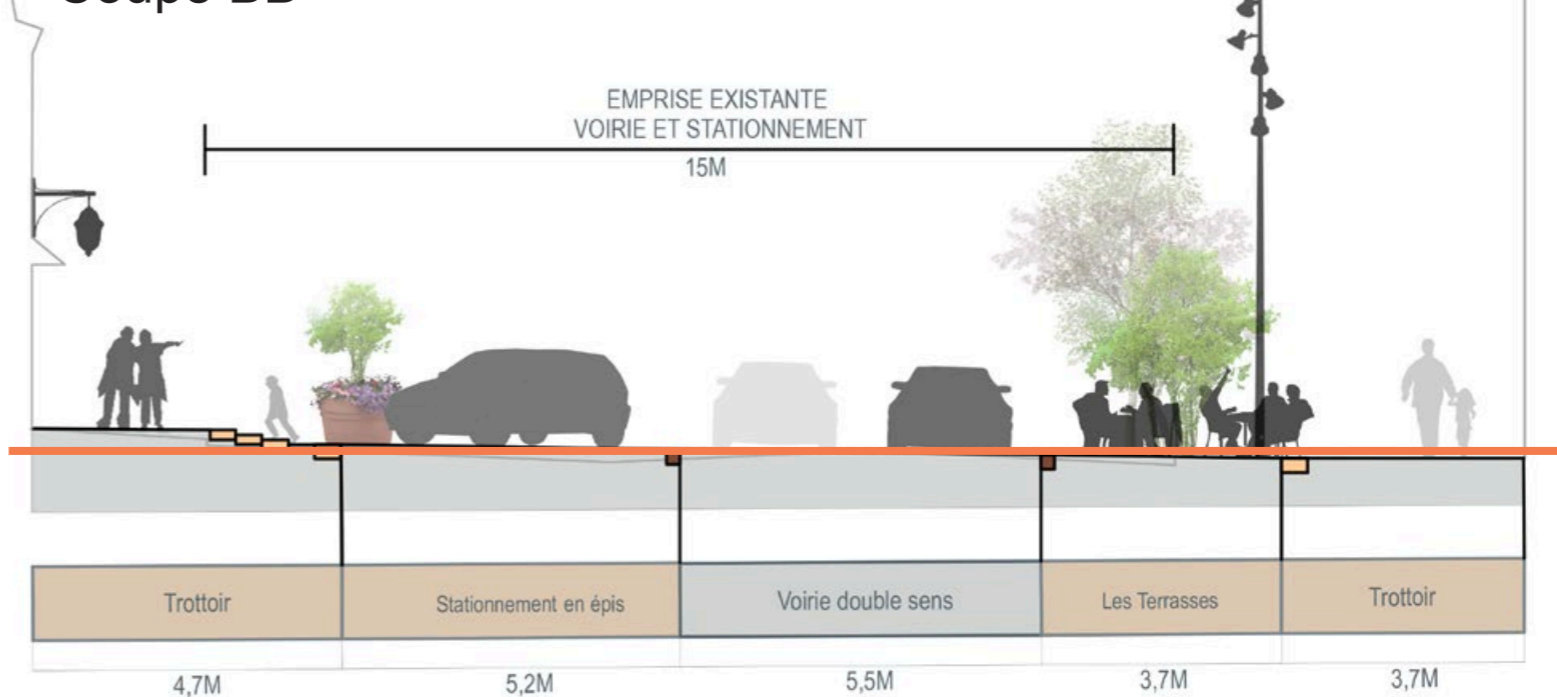

2

PRÉSENTATION DU PROJET - RUE GRANDE




2

PRÉSENTATION DU PROJET - RUE GRANDE




Vers un espace central de convivialité au centre de la future place.

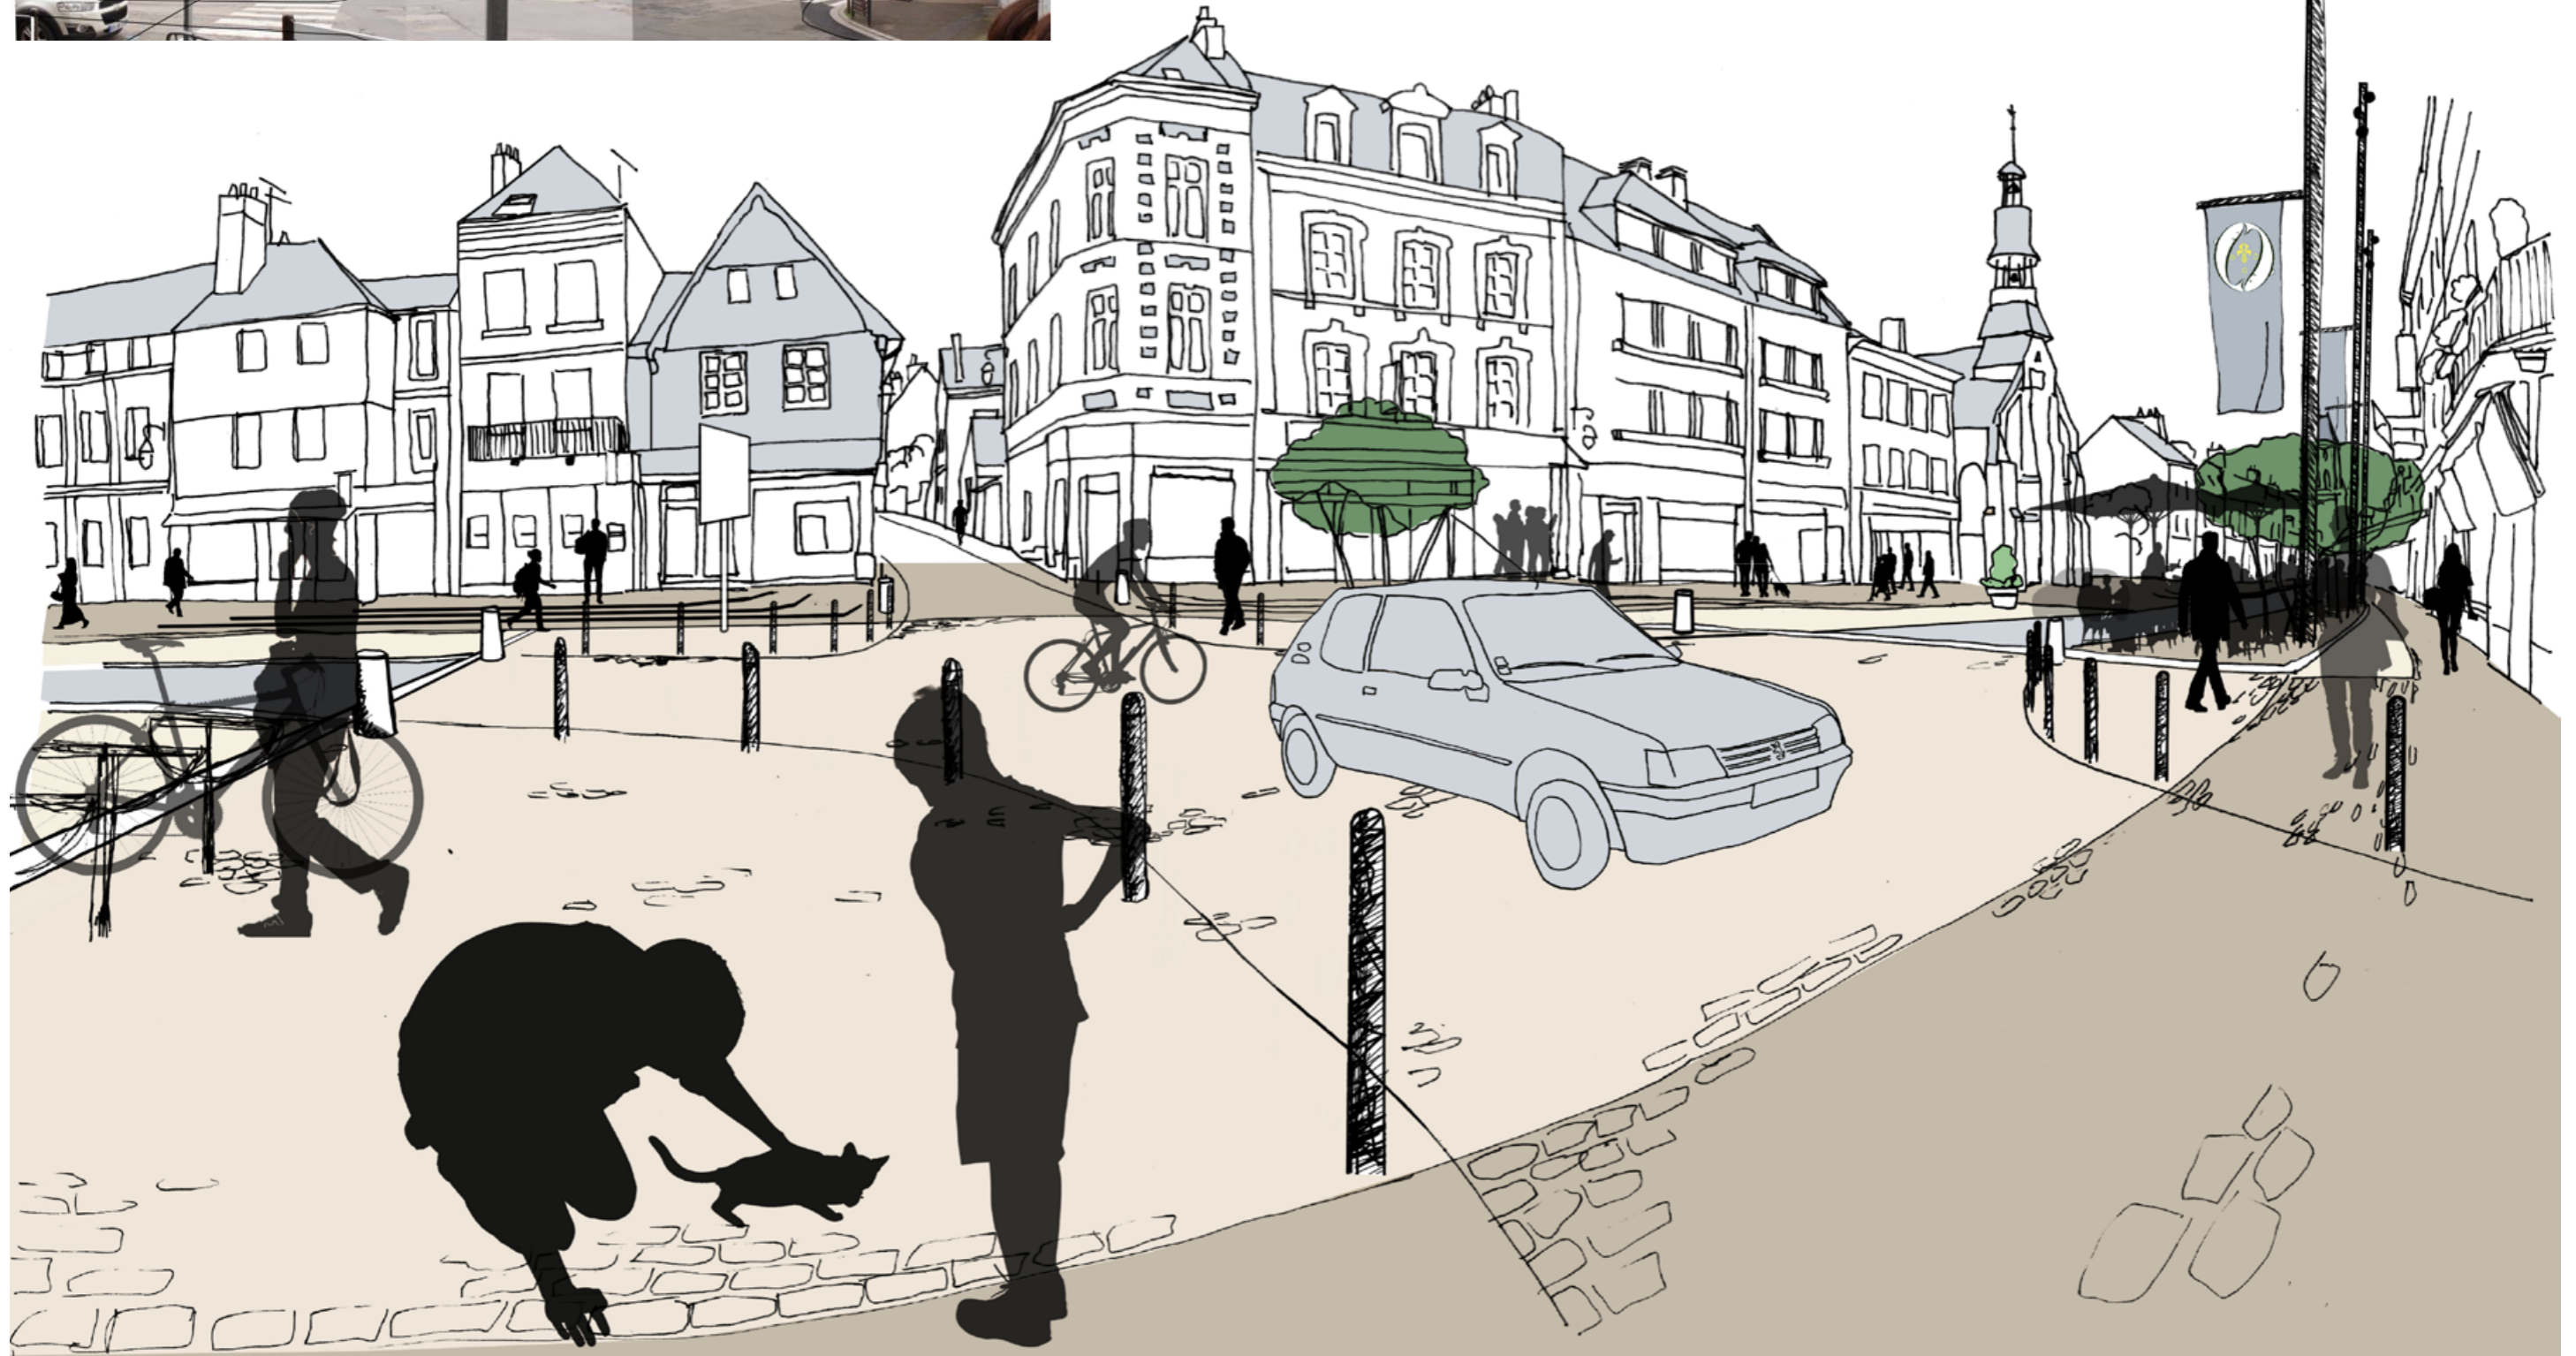


2


PRÉSENTATION DU PROJET - RUE GRANDE

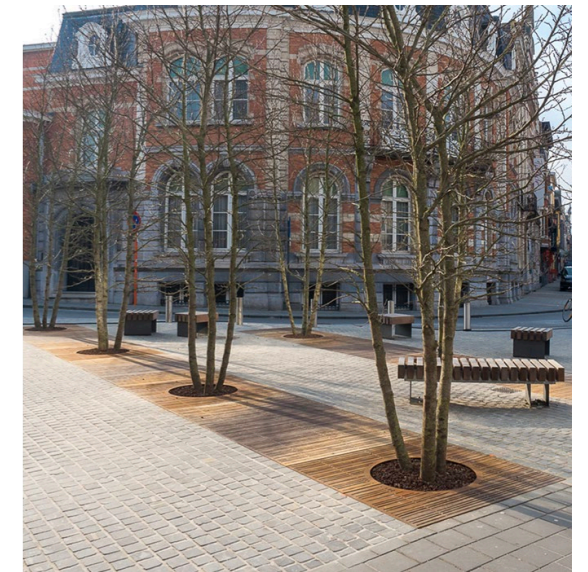


Twiggly



Magic



Bamboo




Matrix

Exemple de grilles d'arbres décoratives personnalisation possible

2 PRÉSENTATION DU PROJET - PARKING RUE HAUTE DE GEÔLE - RUE DES OSIERS

Augmenter l'offre de stationnement longue durée en périphérie de la rue Grande

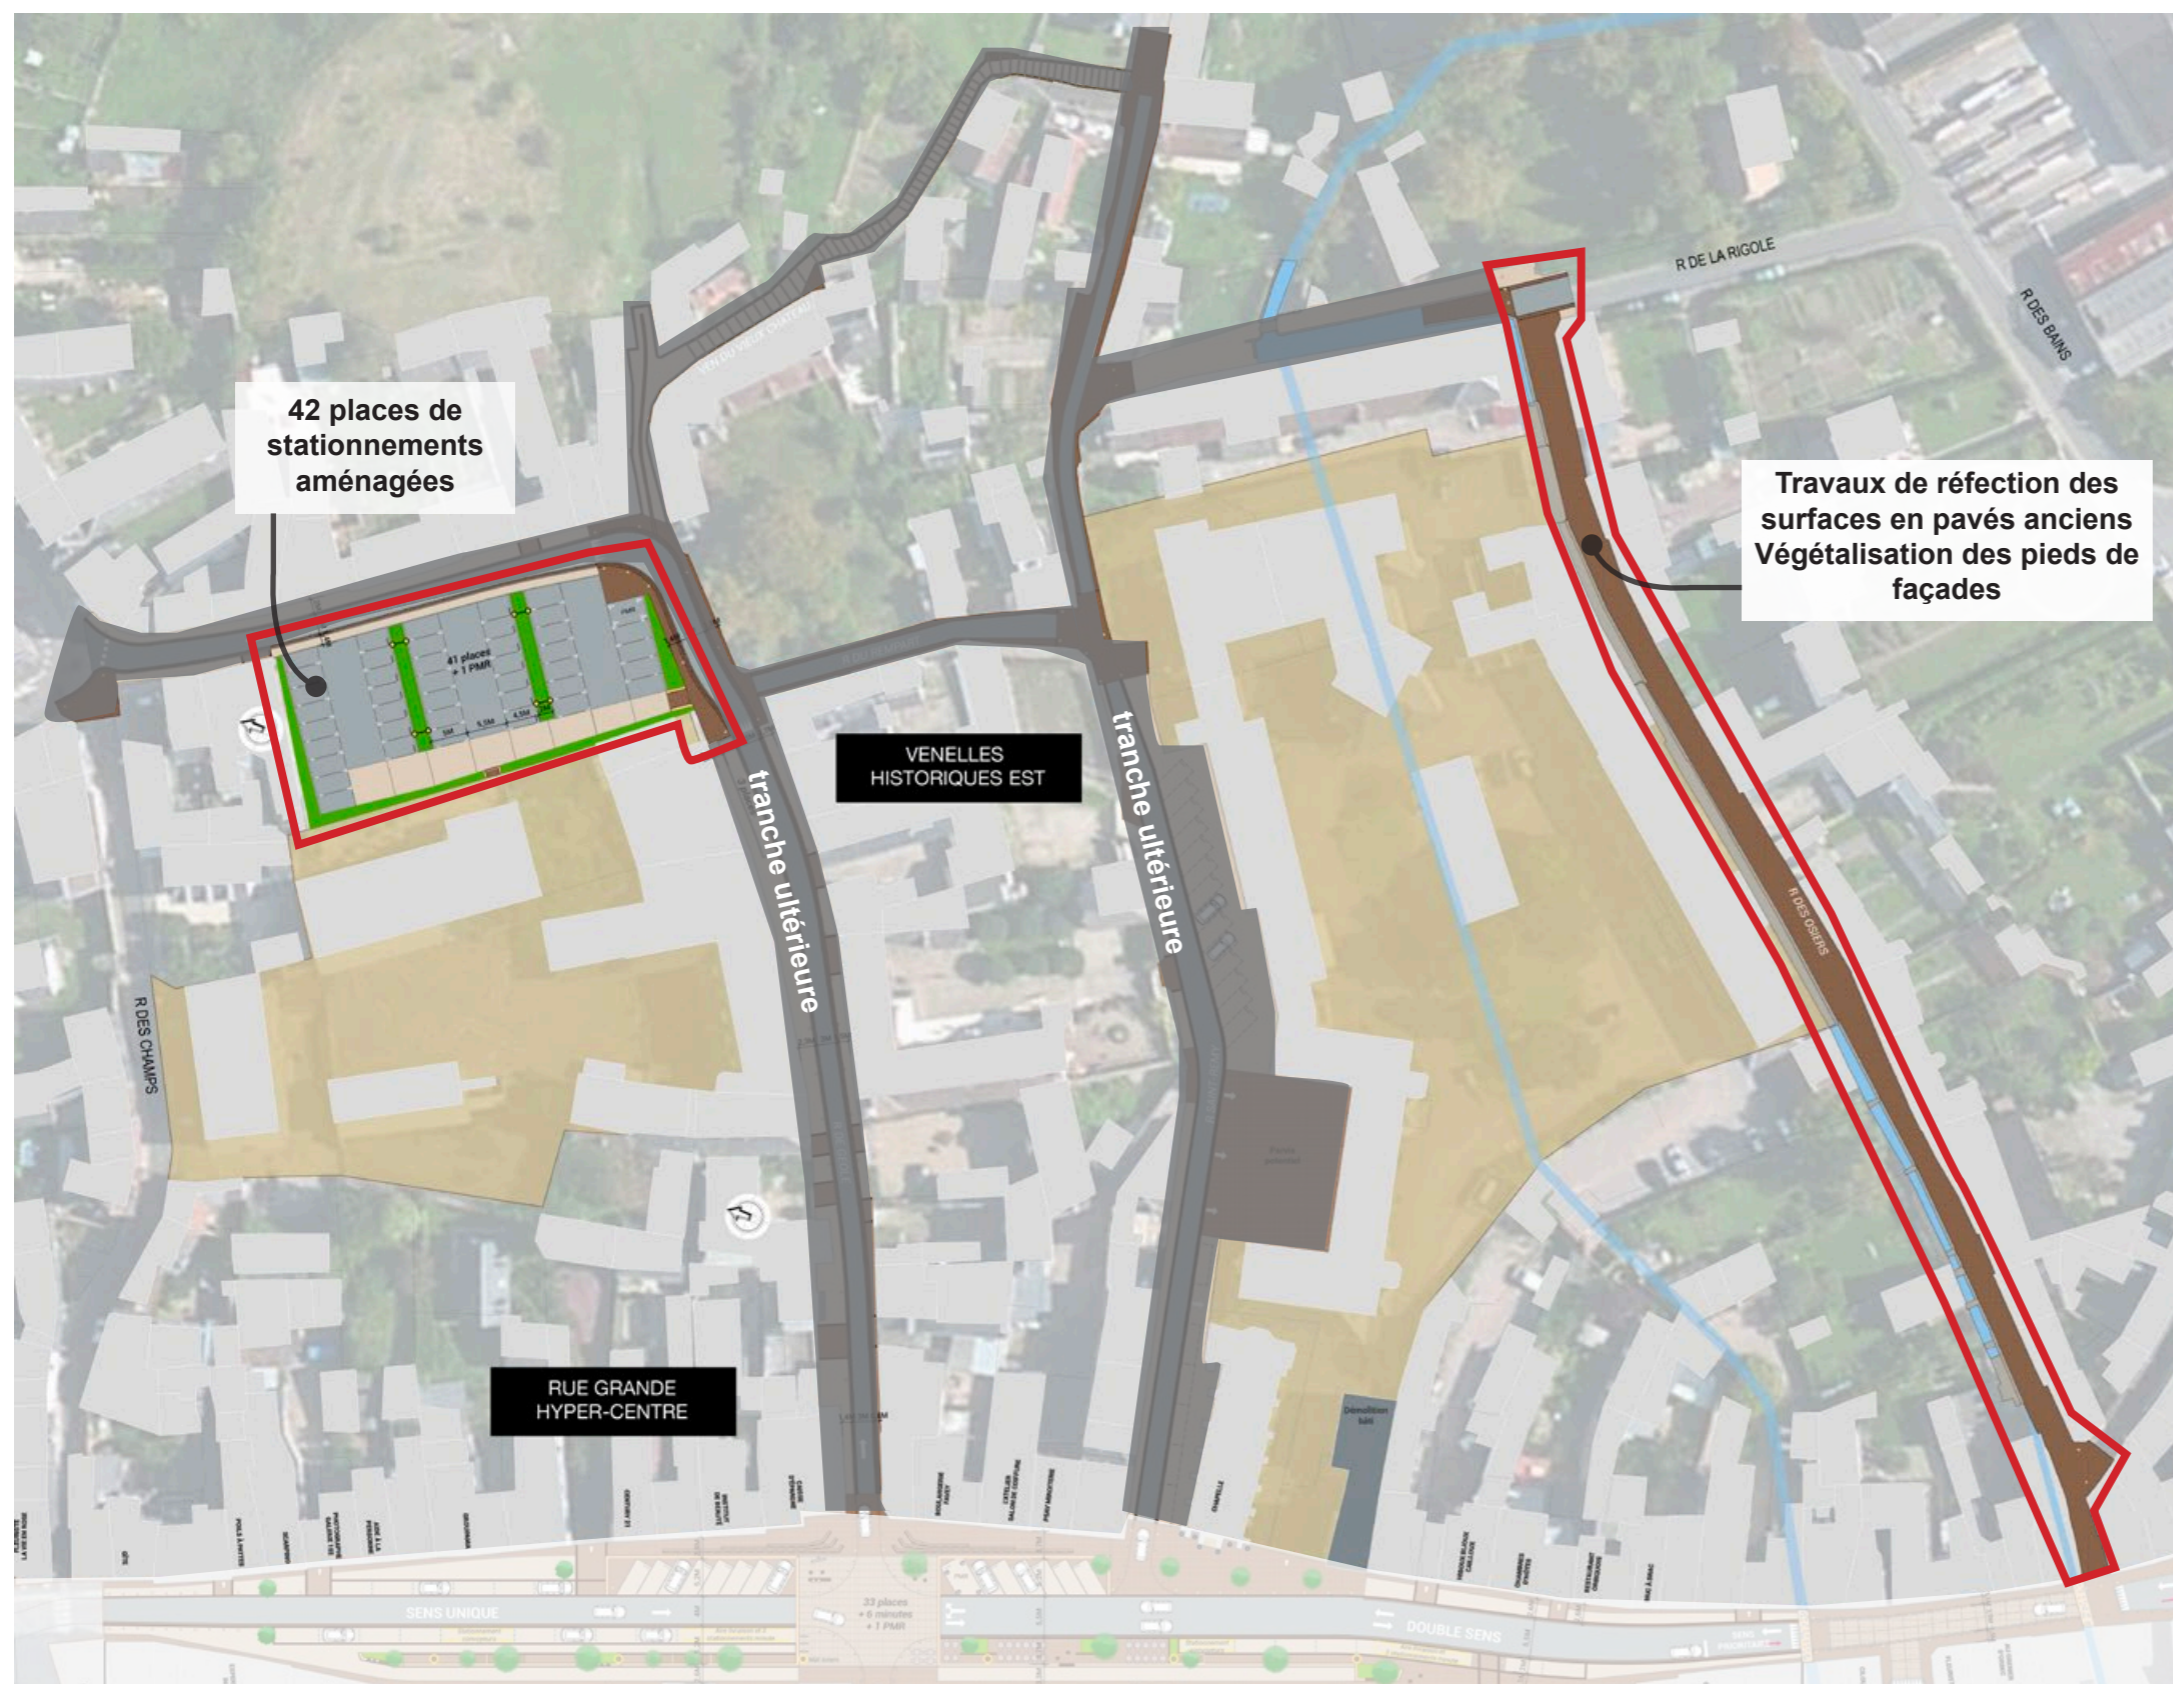

Révéler et apaiser la vie riveraine des venelles et inciter le touriste à la découverte du patrimoine et des chemins d'eau.



→ Conventions avec les riverains à établir pour les plantes grimpantes

3

ORGANISATION DU CHANTIER - PLANNING GÉNÉRAL

ETAPES DE CHAQUE TRANCHE	DELAIS	2020				2021												
		SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	
Renouvellement EU/AEP RUE GRANDE (SIEAPA - AGGLO) entre le musée et la rue des Osiers																		
Préparation de chantier	1 mois																	
Travaux	3 mois - démarrage 26 octobre																	
Travaux d'aménagement VRD CHANTIER - 3 TRANCHES																		
AMIANTE RUE GRANDE - (Tranche 3)	2 semaines - démarrage 5 octobre																	
TRAVAUX D'ENTRETIEN - JOINTS PAVÉ RUE DES OSIERS (Tranche 1)	1 mois - Démarrage à confirmer en novembre																	
TRAVAUX DE VOIRIE & SURFACES - PARKING HAUT DE GEOLE (Tranche 2)	1 mois - Démarrage 28 septembre																	
TRAVAUX DE VOIRIE & SURFACES - HYPER CENTRE (Tranche 3)	8 mois																	
TRAVAUX DE PLANTATIONS	1 mois																	

3

ORGANISATION DU CHANTIER - TRAVAUX VRD

Maîtrise d'Ouvrage




ORBEC

Maîtrise d'Oeuvre





ARC-EN-TERRE
Concepteurs
et Ingénieurs
Paysagistes

MANDATAIRE

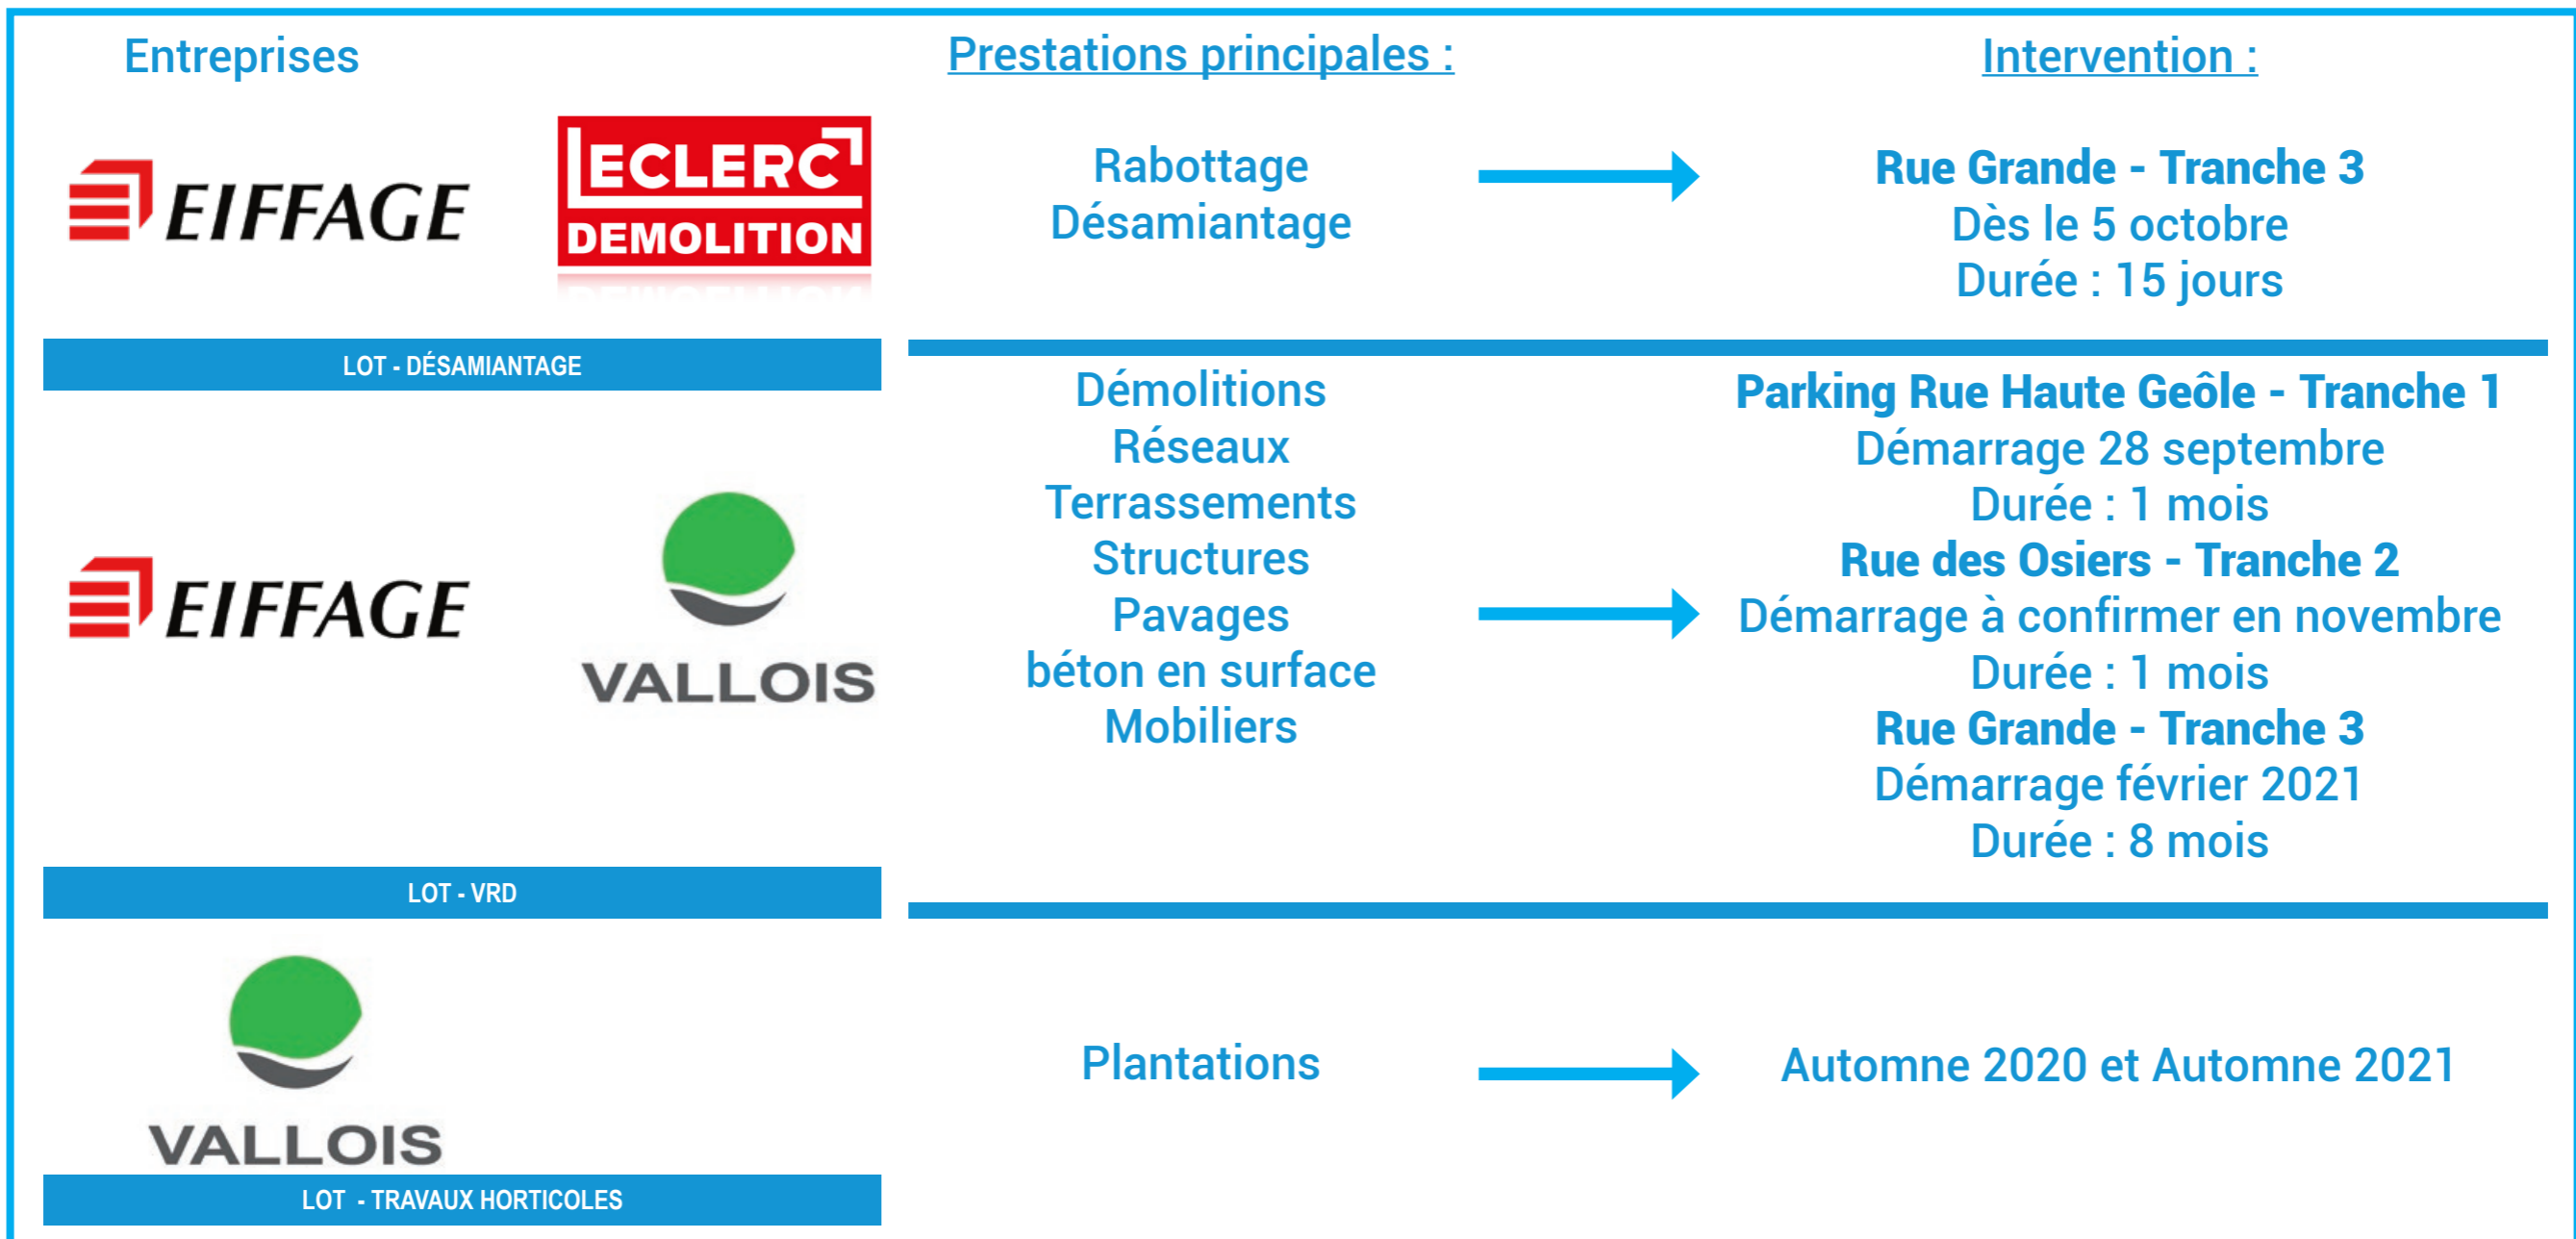

3

ORGANISATION DU CHANTIER - PHASAGE SPÉCIFIQUE TRAVAUX DÉSAMIANTAGE

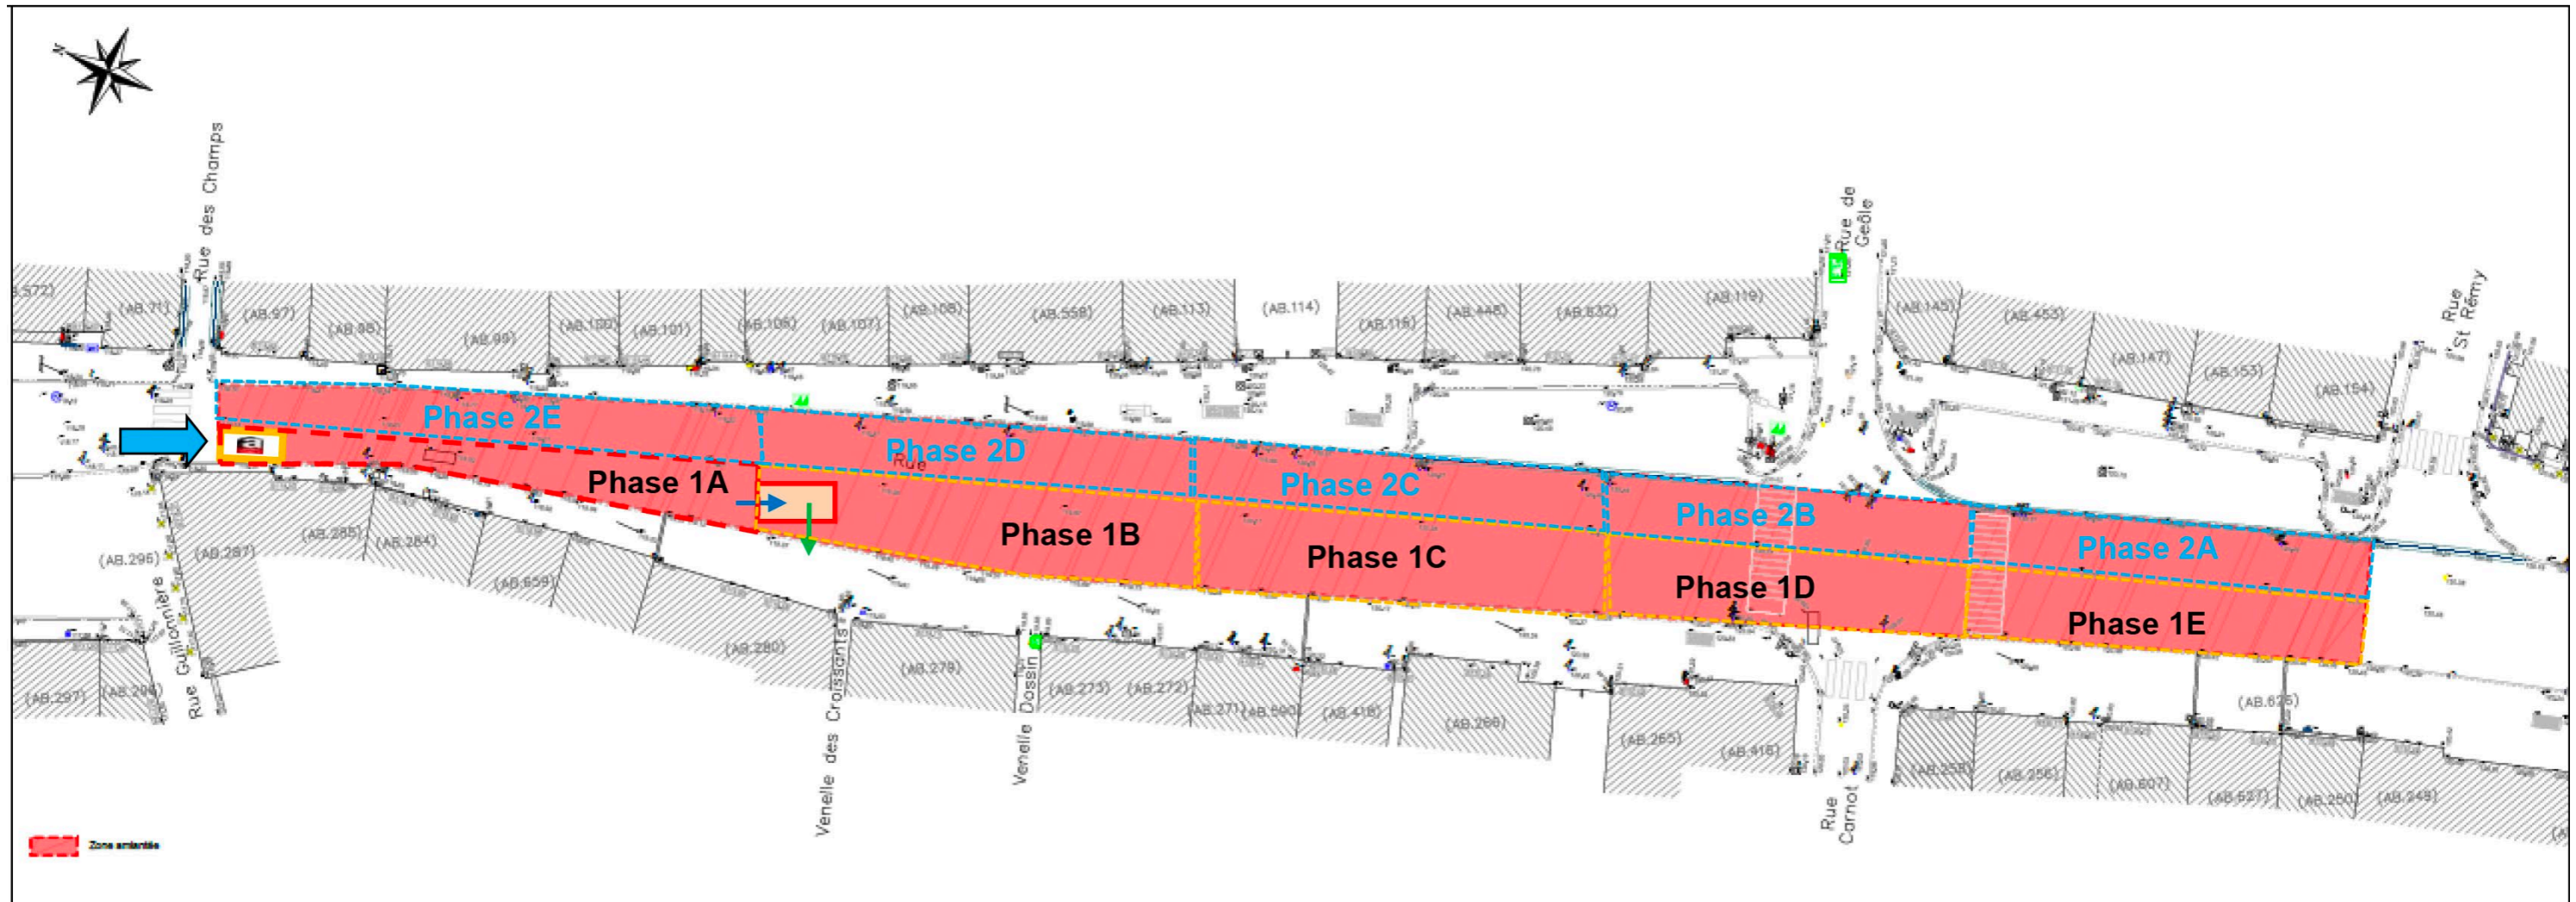

- Zone de stockage des déchets
- Module décontamination amiante
- Barrières HERAS de délimitation du chantier
- Clôtures existantes
- Entrée SAS de décontamination de l'UMD
- Sortie SAS de décontamination de l'UMD
- Accès chantier

Démarrage des prestations : 5 octobre
Délai : 2 semaines

Intervention en demi-chaussée avec maintien de la circulation

SAUF durant 2 jours pendant les mardi 6 et mercredi 7 octobre :
Déviation pour les véhicules légers par la rue des religieuses et inversion de circulation de la rue Carnot (Livraison possible depuis le quartier de l'église)

3

ORGANISATION DU CHANTIER - RÉHABILITATION RÉSEAUX EAUX USÉES ET EAU POTABLE

Maîtrise d'Ouvrage






**LISIEUX
NORMANDIE**
COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION

Maîtrise d'Oeuvre



SA2E
Ingénieurs
Conseils

<u>Entreprises</u>	<u>Prestations principales :</u>	<u>Intervention :</u>
 	Reprise des branchements AEP Réseaux AEP Reprise des branchements EU	<p>Rue Grande Dès le 26 octobre Durée : 3 mois</p> <p>Phase 1 : entre la rue des Champs et la rue Carnot entre le 26 oct. et le 27 nov.</p> <p>Phase 2 : entre la rue Carnot et la rue des Osiers entre le 23 nov. et le 5 fév. 2021</p>

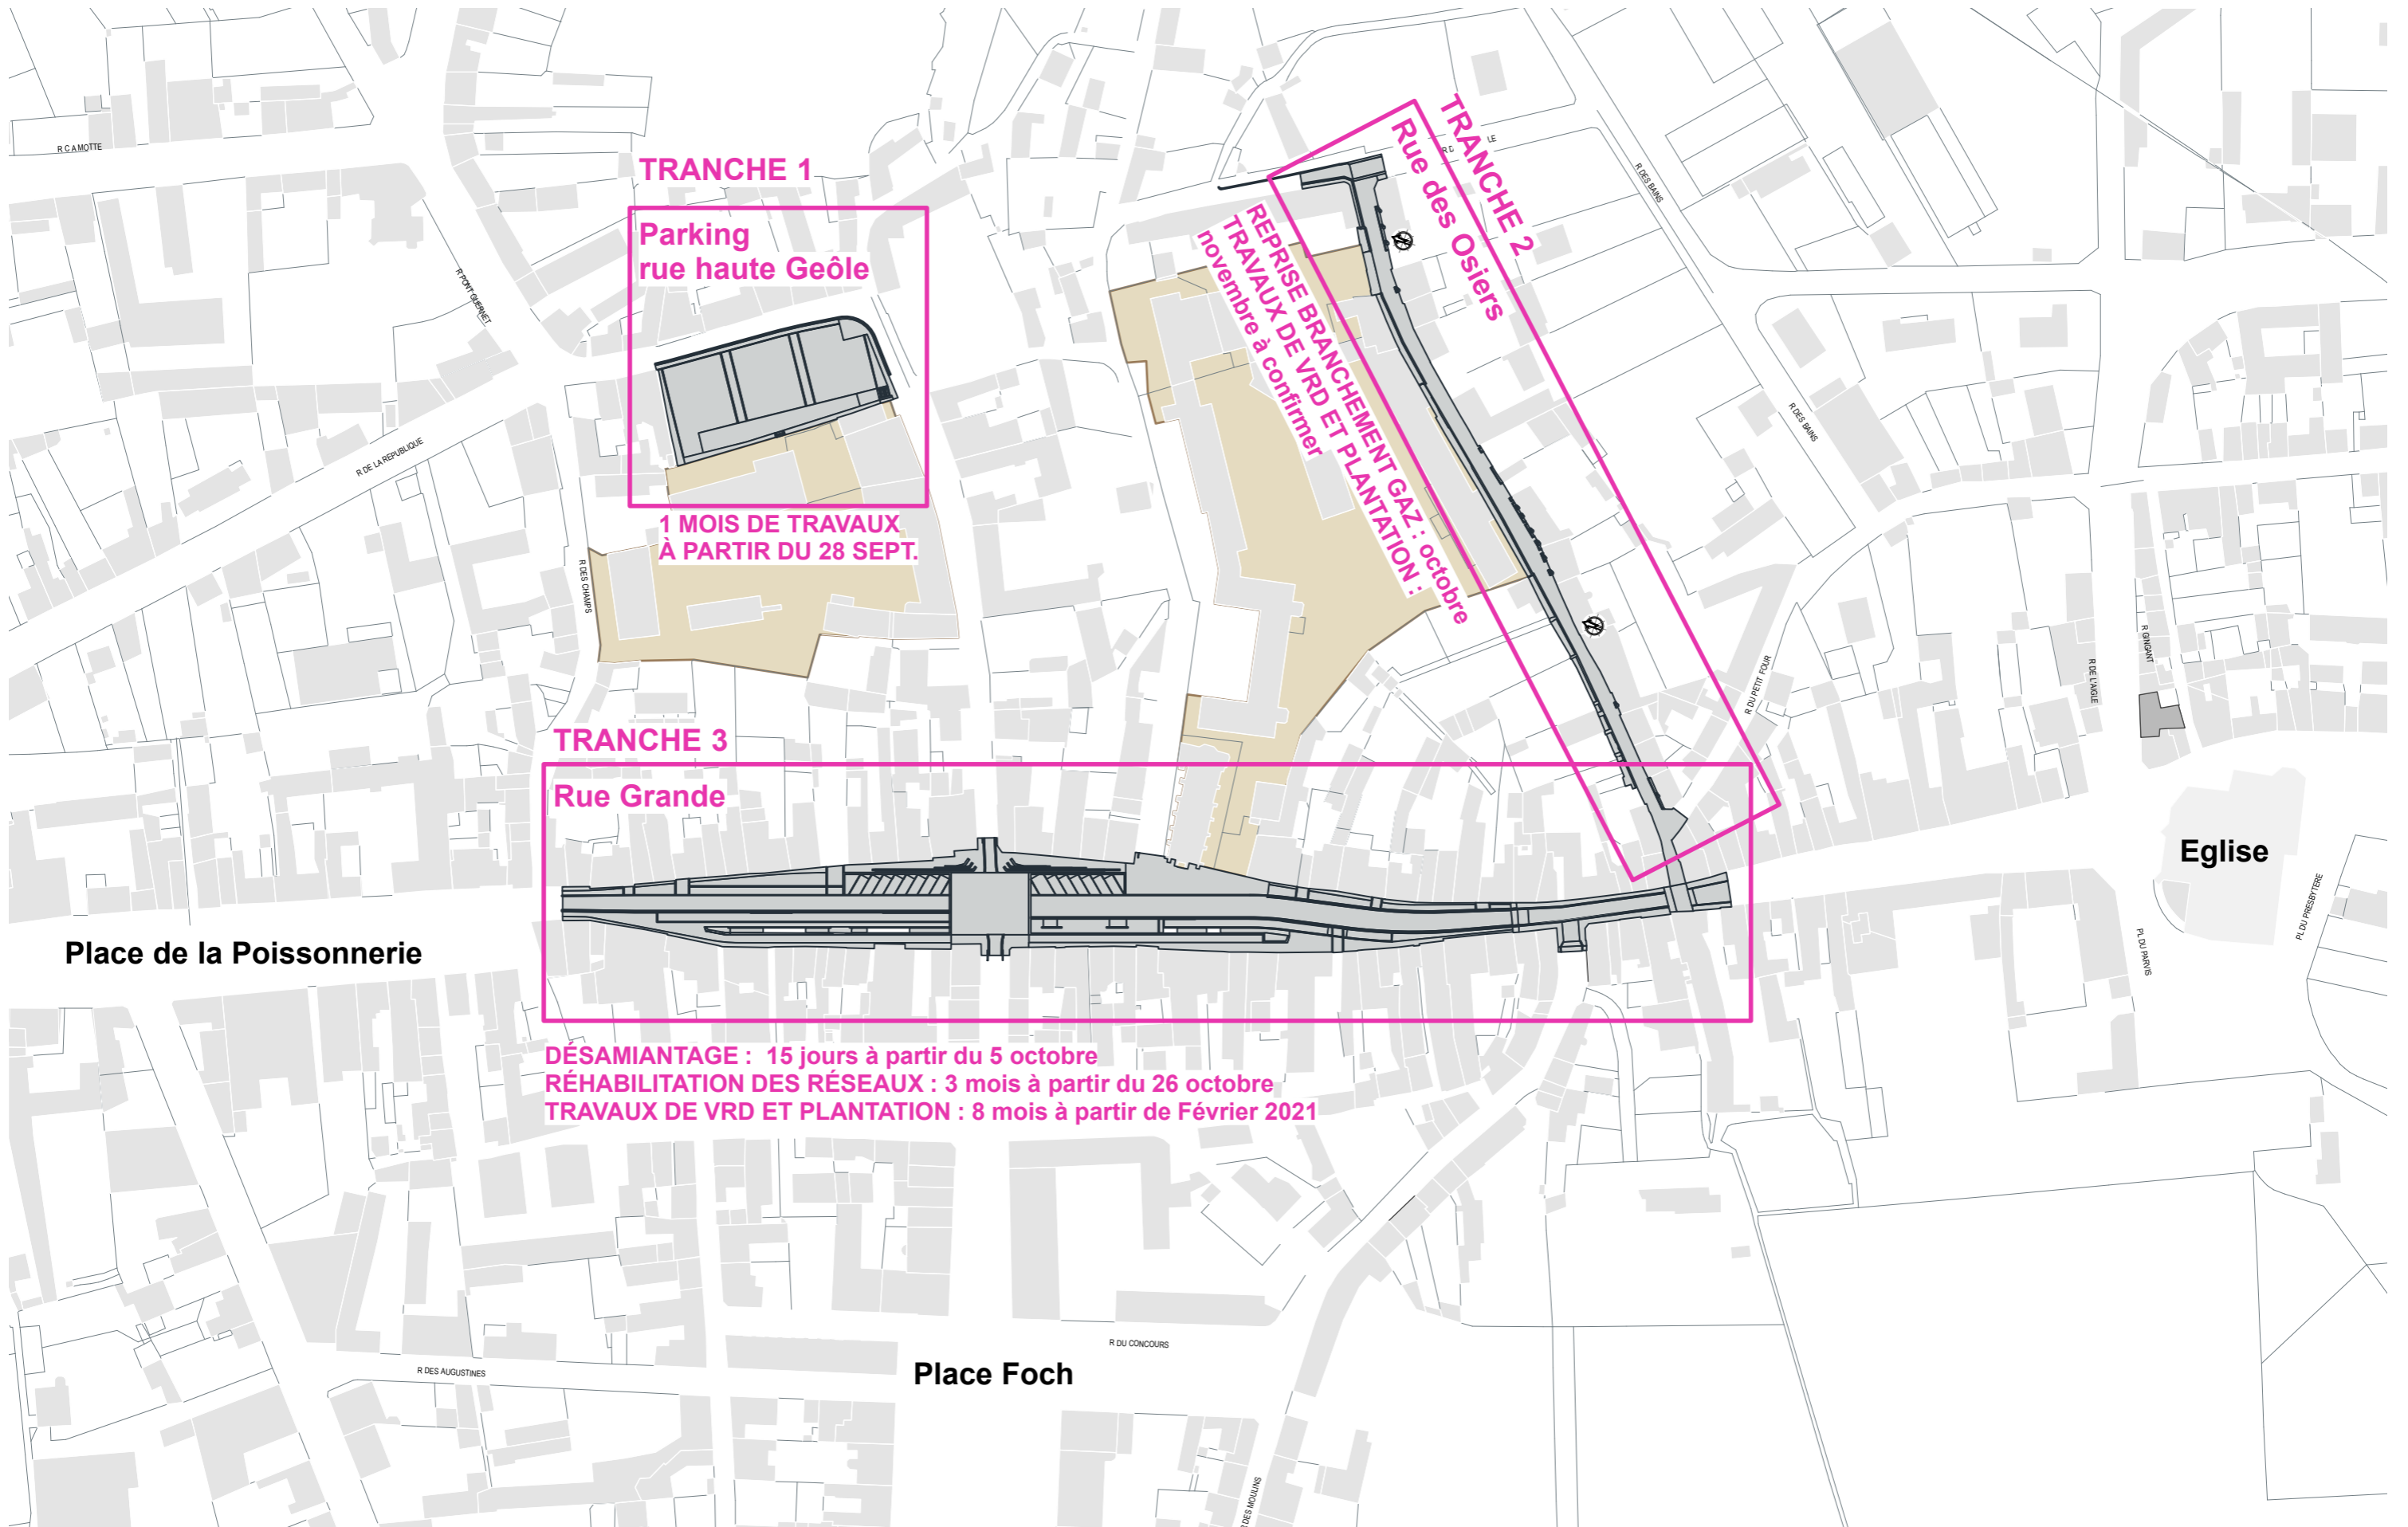


TRANCHE 1
Parking rue haute Geôle
 1 MOIS DE TRAVAUX À PARTIR DU 28 SEPT.

TRANCHE 2
 Rue des Osiers
 REPRISE BRANCHEMENT GAZ : octobre
 TRAVAUX DE VRD ET PLANTATION : novembre à confirmer

TRANCHE 3
 Rue Grande
 DÉSAMIANTAGE : 15 jours à partir du 5 octobre
 RÉHABILITATION DES RÉSEAUX : 3 mois à partir du 26 octobre
 TRAVAUX DE VRD ET PLANTATION : 8 mois à partir de Février 2021



MERCI DE VOTRE ATTENTION

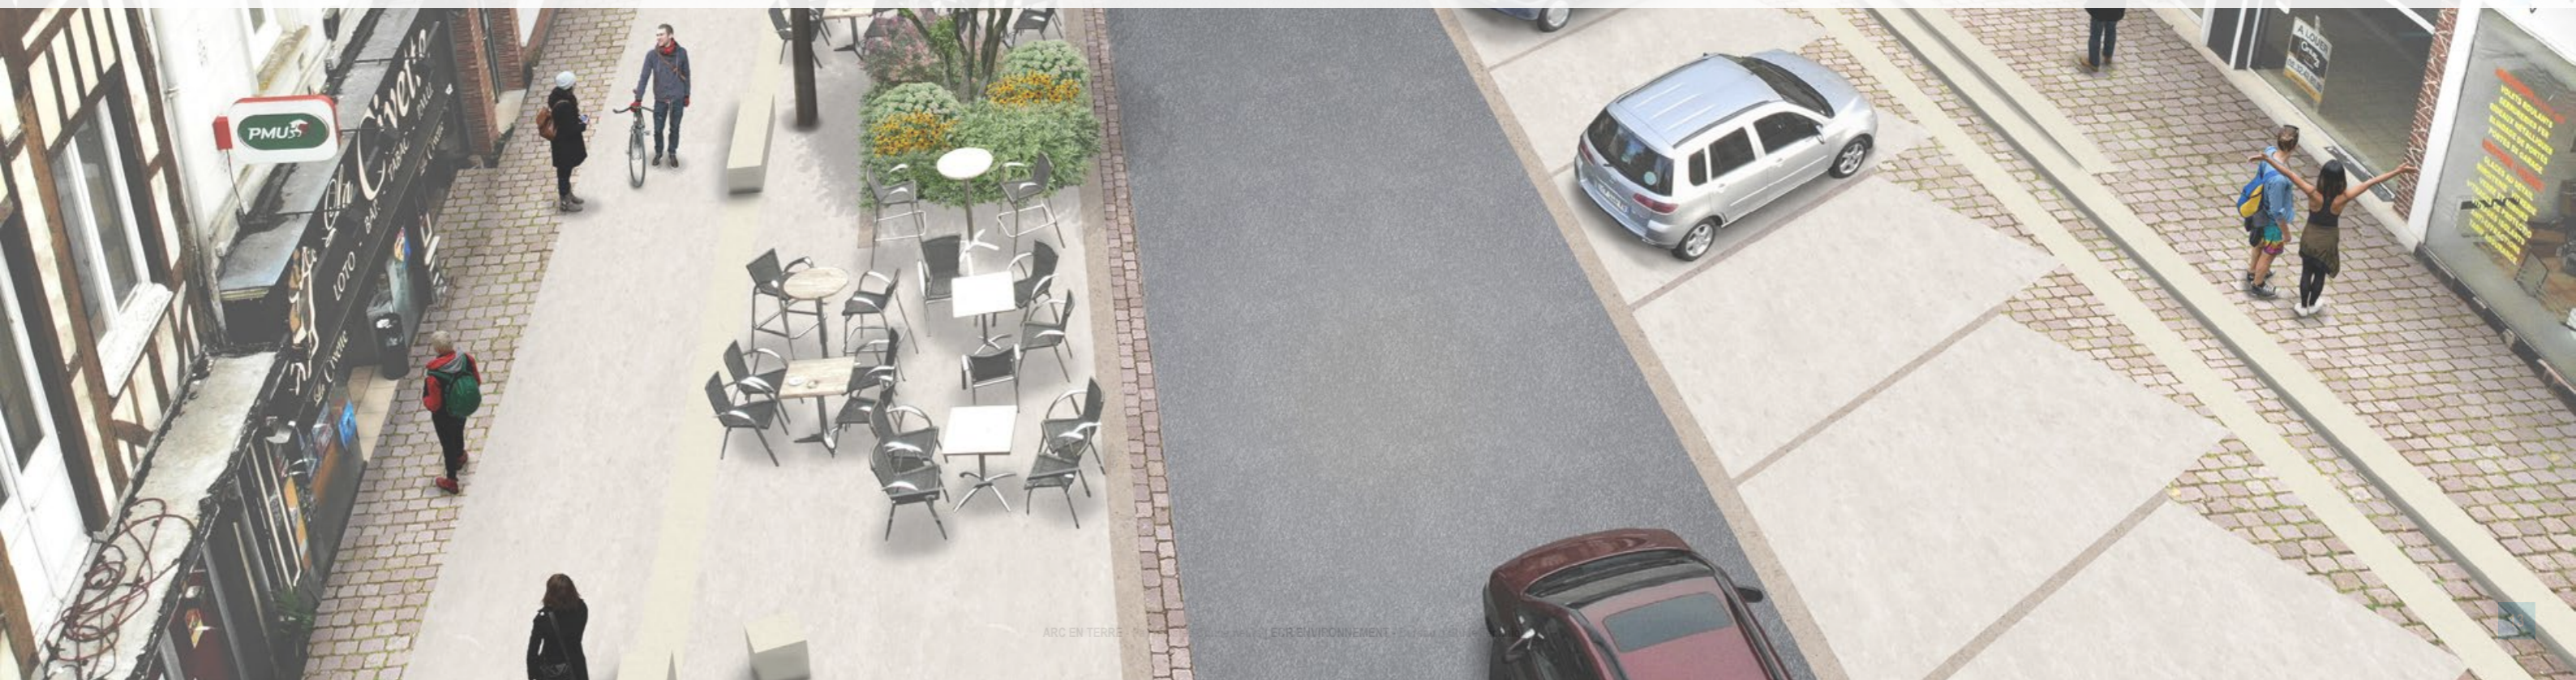

COMPARATIF AVANT/APRÈS PLACE DE LA POISSONNERIE



COMPARATIF AVANT/APRÈS PLACE DE LA POISSONNERIE

